




Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zpráva o naplňování Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje k 30.6.2024

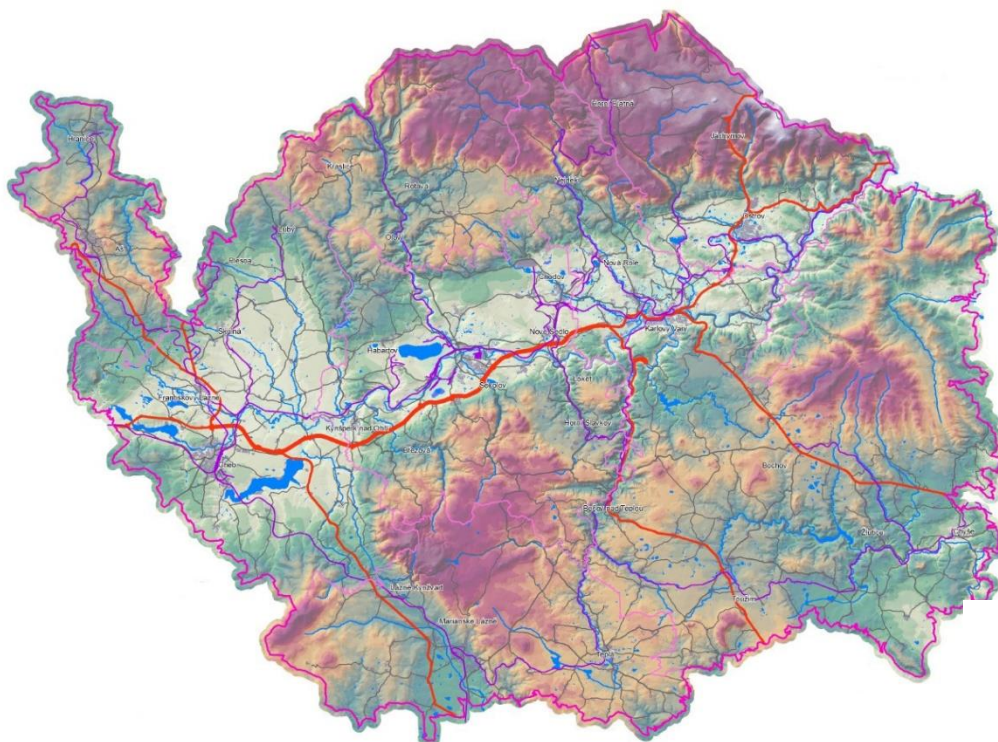

Schváleno Regionální stálou konferencí karlovarského kraje dne 20.02.2025



Obsah

1. Úvod.....	3
2. Střední školství.....	3
3. Silnice II. třídy.....	5
4. Zdravotnická záchranná služba	8
5. Deinstitutionalizace sociálních služeb	10
6. Poradny a speciální školy	12
7. Milníky RAP obecně	14
8. Závěr.....	15



1. Úvod

Regionální akční plán (RAP) je národní intervenční nástroj určený výhradně pro řešení územní dimenze fondů EU ve vybraných tématech. Nepatří mezi integrované územní nástroje (ITI a CLLD). RAP řeší vybraná plošná témata, logicky podepřená a postavená na konsenzu v celé ČR (klíčoví územní partneři, řídicí orgány).

RAP je nástrojem pro naplňování územních cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a přispěje k větší efektivitě čerpání fondů EU. Implementace RAP rovněž přispěje ke snaze zabránit významným finančním převisům v tématech, kde absorpční kapacita a potřeby v území výrazně překračují alokace operačního programu a umožní připravit časově náročné významné projekty s regionálními i nadregionálními dopady.

Zpracování a aktualizaci RAP zajišťuje sekretariát Regionální stálé konference na základě podkladů partnerů zapojených v Regionální stálé konferenci a podkladů dalších aktérů regionálního a místního rozvoje a metodiky Ministerstva pro místní rozvoj. RAP je zpracován v územním obvodu každého kraje a obsahuje aktivity a cíle, kterými se budou realizovat a naplňovat tematické cíle a hlavní výsledky, priority a opatření operačních programů.

RSK zpracovávají v polovině programového období (tj. k 30. 6. 2024) **Zprávy o naplňování RAP**. Nebudou-li ke stanovenému datu plněny harmonogramy a indikátory stanovené ve schváleném RAP bude Zpráva o naplňování RAP obsahovat i opatření, která budou realizována za účelem plnění harmonogramů a indikátorů.

V rámci RAP jsou v dohodnutých tématech Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) stanoveny alokace na úrovni území kraje, které jsou vypočteny na základě objektivně stanoveného klíče schváleného Národní stálou konferencí.

Poslední schválené verze Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje, včetně příslušných tabulek projektových záměrů, je uveden na webu RSKKVK.cz.

2. Střední školství

Klíč: Žáci a studenti SŠ, konzervatoří a VOŠ celkem podle stavu k 30. 9. 2020, resp. k 31. 10. 2020 u VOŠ.

Alokace pro Karlovarský kraj = 90 131 622,84 Kč

Závazek RAP: ŘO IROP nestanoví povinné indikátory, ani cílovou hodnotu na kraj.

Indikátory nebyly naplněny, neboť projektový záměr nebyl podán do příslušné výzvy IROP.

Schválený projektový záměr, viz. příloha č.1, nebyl ke dni 30.06.2024 podán do 42. výzvy IROP. *Procento čerpání (schválené ŽoP) v této aktivitě RAP za Karlovarský kraj činí 0%.*



Příloha č.1: Aktuální seznam projektových záměrů, SŠ, VOŠ, konzervatoře ke dni 19.09.2022

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol v KVK *9)

Seznam projektů	Žadatel	Identifikace organizace (školy či školského zařízení)					Název projektu	Obec realizace	Stručný popis investic projektu	Výdaje projektu v Kč		Předpokládaný termín realizace		Typ projektu 2):							Napiňování indikátorů		Stav připravenosti projektu k realizaci		
		Název organizace	Zřizovatel (název, IČ)	IČ školy či školského zařízení	IZO	REDIZO				celkové výdaje projektu	z toho podíl EFRR 1)	zahájení realizace	ukončení realizace	s vazbou na podporovanou oblast IROP				Zázeří pro školní poradenské pracoviště 6)	Vnitřní/venkovní zázeří pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi 7)	Budování zázeří školních klubů pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií	Konektivita	název indikátoru	cílová hodnota dosažená realizací projektu	stručný popis, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele	vydané stavební povolení ano/ne
														cizí jazyky	přírodní vědy 3)	polytechnické vzdělávání 4)	práce s digitálními tech. 5)								
1	Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace	Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace	Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary IČ 70891168	00077461	130002046	600170462	Cheb	Jedná se o změnu stávající školní budovy Komenského čp. 617, což je objekt se 3 nadzemními podlažními a využitým podkrovím a 1 podzemním podlažím, dokončený cca roku 1910. Budova je z hlediska technického, hygienického a provozního ve špatném stavu a vyžaduje celkovou rekonstrukci. V minulosti probíhaly v objektu pouze dílčí stavební úpravy (hygienické zařízení, změna topné soustavy, výměna podlah atd.) a dostavby. Budova je umístěna v památkové rezervaci a podléhá památkové péči. Rekonstrukce zahrnuje úpravy dispozičního řešení v 1.NP: 2 místnosti šaten (odděleně chlapci, dívky), místnosti občerstvení, úpravu dispozičních hygienických zařízení ve všech podlažích, výstavbu výtahové šachty, opravu vnějšího pláště budovy, opravu střešního pláště budovy vč. zateplení a oplechování mědi, opravu věžičky s hodinami, výměnu podlah v učebnách, dalších místnostech a v tělocvičně, výměnu vnitřních dveří v souladu s požadavky PBŘ vč. klíčového systému, výměnu původní dlažby v chodbách, repasi nebo výměna oken a zabezpečení vstupů do objektu školy (projekt "Bezpečné školy").	119 000 000,00	90 131 622,84	01.01.2023	31.08.2025		x	x	x			x	Indikátor výstupu: Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízeních	603	projektová dokumentace zpracována	ano		
																		Indikátor výstupu: Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení	1						

max. do výše 130 % stanovené alokace (117 171 109,7 Kč při kurzu 24,5Kč/1euro), (100% = 90 131 622,84 Kč)



Opatření k eliminaci rizika nevyčerpání alokace:

Probíhají intenzivní přípravy projektového záměru Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace. Probíhá kontinuální komunikace o postupu přípravných prací mezi Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu karlovarského kraje, nositelem projektu a sekretariátem Regionální stálé konference Karlovarského kraje. Předpokládá se podání žádosti do příslušné výzvy do konce roku 2024.

Milníky čerpání:

SŠ							
Rok	Objem alokace EFRR za rok ve výzvách	Roky kumulativně	Objem alokace EFRR kumulativně v letech ve výzvách	Rok	Objem alokace EFRR za rok v ŽoP	Roky kumulativně	Objem alokace EFRR kumulativně v letech v ŽoP
2021	0	2021	0	2021	0	2021	0
2022	528 720 090	2021-2022	528 720 090	2022	0	2021-2022	0
2023	537 387 632	2021-2023	1 066 107 722	2023	0	2021-2023	0
2024	546 055 175	2021-2024	1 612 162 896	2024	0	2021-2024	0
2025	554 722 717	2021-2025	2 166 885 613	2025	528 720 090	2021-2025	528 720 090
2026	459 689 305	2021-2026	2 626 574 918	2026	537 387 632	2021-2026	1 066 107 722
2027	468 975 958	2021-2027	3 095 550 876	2027	546 055 175	2021-2027	1 612 162 896
2028	0	2021-2028		2028	554 722 717	2021-2028	2 166 885 613
2029	0	2021-2029		2029	928 665 263	2021-2029	3 095 550 876

3. Silnice II. třídy

Klíč: Průměr ze součtu délky silnic II. třídy v rámci prioritní sítě IROP II a celkové délky silnic II. třídy v krajích.

Alokace pro Karlovarský kraj = 502 566 751,79 Kč

Závazek RAP: ŘO IROP nestanoví povinné indikátory, ani cílovou hodnotu na kraj.

Indikátory nebyly naplněny, neboť u projektových záměrů ještě nedošlo k dokončení realizace.

Sekretariát Regionální stálé konference Karlovarského kraje obdržel dne 26.8.2024 od Ministerstva pro místní rozvoj sestavu SP875, která za IROP obsahuje všechny ŽoP s vazbou na projekty RAP v IROP.

Z této vyplývá, že projektový záměr II/198 Modernizace silnice Toužim – Prachometry nebyl k 30.6.2024 podán do příslušné výzvy.

K 30.06.2024 bylo podáno do výzvy 7 projektů s celkovým požadavkem na alokaci EU ve výši 98,8 % vyčleněné pro Karlovarský kraj.

Přehled schválených ŽoP:

- ✓ II/217 Modernizace silnice – průtah Aš – schválená a proplacená ŽoP ve výši 14 362 245,31 Kč

Přehled předložených ŽoP:

- ✓ II/214 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad – ŽoP vrácená k dopracování ve výši 11 522 560,03 Kč



Z výše uvedeného vyplývá, že procento čerpání v aktivitě RAP silnice II. třídy k datu 30.6.2024 *ve schválených a proplacených ŽoP činí 2,86%* (bráno ku 100% alokaci stanovené pro KVK).

Dále lze hypoteticky konstatovat, že v případě započtení druhé předložené ŽoP, která byla vrácena k dopracování, se procento čerpání zvýší na 5,15% (bráno ku 100% alokaci stanovené pro KVK).

SP875:Přehled ŽoP na projektech RAP v IROP								
Datum generování: 26.08.24								
SC ČR	Číslo výzvy ŘO (z názvu výzvy)	Název výzvy	Kraj RAP	Registrační číslo projektu	Název projektu	Skupina stavu WF projektu	Kód a název aktuálního stavu WF	Datum nastavení akt. stavu WF
SC 3.1	21	21. výzva I	Karlovarský kraj	CZ.06.03.01/00/22_021/0001228	II/214 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad	3a V Realizaci - vydán PA + pozastav	PIP14 Projekt se zaregistrovanou	18.07.24 20:48
SC 3.1	21	21. výzva I	Karlovarský kraj	CZ.06.03.01/00/22_021/0002064	II/213 Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtan	3a V Realizaci - vydán PA + pozastav	PP30 Projekt s právním aktem	03.04.23 13:19
SC 3.1	21	21. výzva I	Karlovarský kraj	CZ.06.03.01/00/22_021/0002203	Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo	3a V Realizaci - vydán PA + pozastav	PP30 Projekt s právním aktem	03.04.23 13:20
SC 3.1	21	21. výzva I	Karlovarský kraj	CZ.06.03.01/00/22_021/0002362	II/217 Modernizace silnice - průtah Aš	3b V Realizaci - částečně proplaceno	PP31 Projekt v realizaci	29.04.24 21:00
SC 3.1	21	21. výzva I	Karlovarský kraj	CZ.06.03.01/00/22_021/0002362	II/217 Modernizace silnice - průtah Aš	3b V Realizaci - částečně proplaceno	PP31 Projekt v realizaci	29.04.24 21:00
SC 3.1	21	21. výzva I	Karlovarský kraj	CZ.06.03.01/00/22_021/0002757	II/207 Modernizace silnice Toužim - Smiřov	3a V Realizaci - vydán PA + pozastav	PP30 Projekt s právním aktem	13.11.23 08:43
SC 3.1	21	21. výzva I	Karlovarský kraj	CZ.06.03.01/00/22_021/0002757	II/207 Modernizace silnice Toužim - Smiřov	3a V Realizaci - vydán PA + pozastav	PP30 Projekt s právním aktem	13.11.23 08:43
SC 3.1	21	21. výzva I	Karlovarský kraj	CZ.06.03.01/00/22_021/0003225	II/198 Modernizace silnice Teplá - Horní Kramol	3a V Realizaci - vydán PA + pozastav	PP30 Projekt s právním aktem	15.01.24 08:35
SC 3.1	21	21. výzva I	Karlovarský kraj	CZ.06.03.01/00/22_021/0005088	II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstr	2a Dohodnocené - předané Centrem	PIP13 Žádost o podporu doporu	19.08.24 10:27
SC 3.1	21	21. výzva I	Karlovarský kraj	CZ.06.03.01/00/22_021/0005088	II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstr	2a Dohodnocené - předané Centrem	PIP13 Žádost o podporu doporu	19.08.24 10:27



Příloha č.2: Aktuální seznam projektových záměrů, silnice II. třídy ke dni 22.03.2024

RAP databáze	Silnice II. třídy										Multikriteriální hodnocení projektů												Body celkem			
	Seznam projektů	Název projektu	Číslo silnice	Krajní body úseku		Výdaje projektu v Kč		Předpokládaný termín realizace měsíc, rok		Napřívání indikátorů		Stav připravenosti projektu k realizaci		Stav připravenosti projektu k realizaci (váha 0,4)			Intenzita provozu (váha 0,1)			Stavebně - technický stav (váha 0,2)				Celková kvalita silničního spojení (potřeba, kapacita, bezpečnost, plynulost, budoucí rozvoj, návaznost na dokončené úseky nebo jiné investice měst a obcí, ...) (váha 0,3)		
				začátek	konec	celkové výdaje projektu	z toho podíl EFRR	zahájení realizace	ukončení realizace	název indikátoru	cílová hodnota dosažená realizací projektu	stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele	vydané stavební povolení ano/ne	popis	hodnocení	body	hodnota (voz./24 hod.)	hodnocení	body	hodnota	hodnocení	body		popis	hodnocení	body
1	1	II/217 Modernizace silnice - průtah Aš	II/217	kř. I/64	kř. ul. Okružní	115 368 900	97 975 000	06/2023	11/2024	modernizace silnic	2,640	schváleno, v realizaci, dokončení 2024, ukončení projektu 2025	ano	PDPS, stavební povolení	10	40	7945	100,0	10,0	4	80	16	spoluúčast města Aš - chodníky, VO	8	24	90,0
	2	II/207 Modernizace silnice Toužim - Smilov	II/207	kř. II/198	kř. III/2072	81 921 000	65 018 300	09/2023	01/2025	modernizace silnic	1,682	schváleno, v realizaci, dokončení 2025, ukončení projektu 2025	ano	PDPS, stavební povolení	10	40	763	9,6	1,0	4	80	16	spoluúčast města Toužim - chodníky, VO, návaznost na	10	30	87,0
	3	II/214 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad	II/214	kř. III/2148	kř. III/2148	21 605 300	11 632 800	04/2023	06/2024	modernizace silnic	0,069	schváleno, v realizaci, dokončení 2024, ukončení projektu 2024	ano	PDPS, stavební povolení	10	40	3359	42,3	4,2	2	40	8	návaznost na zrealizované úseky, kapacita, rozvoj	8	24	76,2
	4	Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo - Loket	II/209	most	-	55 001 300	46 604 300	04/2024	12/2024	modernizace silnic / stavební úprava mostů	0,075 / 1,0	schváleno, realizace 2024, ukončení projektu 2025	ano	PDPS, podání žádosti o SP	7	28	4883	61,5	6,1	5	100	20	návaznost na stavbu D6	7	21	75,1
	5	II/213 Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov	II/213	kř. III/21313	kř. I/21	48 153 800	34 690 800	04/2023	12/2024	modernizace silnic	2,997	schváleno, v realizaci, dokončení 2024, ukončení projektu 2025	ano	PDPS, stavební povolení	10	40	623	7,8	0,8	3	60	12	spoluúčast města Skalná - chodníky, VO, dešťová kanalizace	7	21	73,8
	6	II/198 Modernizace silnice Teplá - Horní Kramolín	II/198	kř. III/19828	kř. III/19830	139 487 100	105 396 800	02/2025	12/2025	modernizace silnic	2,460	schváleno, probíhá zadání realizace, předpoklad realizace 2025, ukončení projektu 2026	ano	PDPS, podání žádosti o SP	7	28	1515	19,1	1,9	4	80	16	návaznost na zrealizované úseky	8	24	69,9
	7	II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání	II/210	kř. II/208	kř. III/21027	108 235 300	92 000 000	04/2025	10/2026	modernizace silnic	2,60	rozšíření projektu o jeden úsek, aktualizace PD, projektová žádost cca 1. pol. 2024	ano, částečně	PDPS, stavební povolení na úsek 3	8	32	698	8,8	0,9	4	80	16	návaznost na zrealizované úseky	6	18	66,9
	8	II/198 Modernizace silnice Toužim - Prachomety	II/198	kř. I/20	kř. III/19821	235 316 200	200 018 775	04/2025	10/2026	modernizace silnic	5,10	rozšíření projektu, aktualizace PD	ano, částečně	PDPS, byla zahájena příprava stavby, most Kosmová má SP	6	24	1420	17,9	1,8	3	60	12	spoluúčast města Toužim - chodníky, VO, návaznost na zrealizované úseky	8	24	61,8
						805 088 900	653 336 775				17,55															
		max. do výše 130% stanovené alokace (653 336 775Kč při kurzu 24,5Kč/1euro), (100% = 502 566 750Kč)																								



Milníky čerpání:

SILNICE							
Rok	Objem alokace EFRR za rok ve výzvách	Roky kumulativně	Objem alokace EFRR kumulativně v letech ve výzvách	Rok	Objem alokace EFRR za rok v ŽoP	Roky kumulativně	Objem alokace EFRR kumulativně v letech v ŽoP
2021	0	2021	0	2021	0	2021	0
2022	1 736 470 611	2021-2022	1 736 470 611	2022	0	2021-2022	0
2023	1 764 937 342	2021-2023	3 501 407 953	2023	0	2021-2023	0
2024	1 793 404 073	2021-2024	5 294 812 026	2024	0	2021-2024	0
2025	1 821 870 805	2021-2025	7 116 682 831	2025	1 736 470 611	2021-2025	1 736 470 611
2026	1 509 753 429	2021-2026	8 626 436 261	2026	1 764 937 342	2021-2026	3 501 407 953
2027	1 540 253 498	2021-2027	10 166 689 759	2027	1 793 404 073	2021-2027	5 294 812 026
2028	0	2021-2028		2028	1 821 870 805	2021-2028	7 116 682 831
2029	0	2021-2029		2029	3 050 006 928	2021-2029	10 166 689 759

4. Zdravotnická záchranná služba

Klíč: Počet výjezdových základem a výjezdových skupin (50 : 50).

Alokace pro Karlovarský kraj = 76 603 171,64 Kč

Závazek RAP: ŘO IROP nestanoví povinné indikátory, ani cílovou hodnotu na kraj.

Indikátory nebyly naplněny, neboť u projektových záměrů ještě nedošlo k dokončení realizace.

Sekretariát Regionální stálé konference Karlovarského kraje obdržel dne 26.8.2024 od Ministerstva pro místní rozvoj sestavu SP875, která za IROP obsahuje všechny ŽoP s vazbou na projekty RAP v IROP.

Z této vyplývá, že projektový záměr Elektronizace evidence pacientů při HPO (PKP1) ještě nebyl k 30.6.2024 podán do příslušné výzvy.

K 30.06.2024 byly podány do výzvy 2 projekty s celkovým požadavkem na alokaci EU ve výši 94,2 % vyčleněné pro Karlovarský kraj.

Procento čerpání (schválené ŽoP) v této aktivitě RAP za Karlovarský kraj činí 0%.

SP875:Přehled ŽoP na projektech RAP v IROP								
Datum generování: 26.08.24								
SC ČR	Číslo výzvy ŘO (z názvu výzvy)	Název výzvy	Kraj RAP	Registrační číslo projektu	Název projektu	Skupina stavu WF projektu	Kód a název aktuálního stavu WF	Datum nastavení akt. stavu WF
SC 2.1	12	12. výzva	Karlovarský kraj	CZ.06.02.01/00/22_012/0002353	Obnova výjezdových vozidel ZZS	3a V Realizaci - vydán PA + pozastav	PP30 Projekt s právním aktem	04.08.23 07:46
SC 2.1	12	12. výzva	Karlovarský kraj	CZ.06.02.01/00/22_012/0002353	Obnova výjezdových vozidel ZZS	3a V Realizaci - vydán PA + pozastav	PP30 Projekt s právním aktem	04.08.23 07:46
SC 2.1	12	12. výzva	Karlovarský kraj	CZ.06.02.01/00/22_012/0002353	Obnova výjezdových vozidel ZZS	3a V Realizaci - vydán PA + pozastav	PP30 Projekt s právním aktem	04.08.23 07:46
SC 2.1	12	12. výzva	Karlovarský kraj	CZ.06.02.01/00/22_012/0005182	Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby	1b Registrované - v hodnocení	PP22 Žádost o podporu splnila f	12.08.24 09:38



Příloha č.3: Aktuální seznam projektových záměrů, zdravotnické záchranné služby ke dni 22.03.2024

Integrovaný záchranný systém - zdravotní služby																	
Seznam projektů	Název projektu	Stručný obsah projektu	Žadatel	Adresa žadatele, kontaktní údaje žadatele	Výdaje projektu v Kč		Předpokládaný termín realizace měsíc, rok		Naplnění indikátorů		Stav připravenosti projektu k realizaci		Prioritizace projektů				
					celkové výdaje projektu	z toho podíl EFRR + SR (85%)	zahájení realizace	ukončení realizace	název indikátoru	cílová hodnota dosažená realizací projektu	stručný popis, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele	vydané stavební povolení ano/ne/nerelevantní	akutní potřeby	zajištění vyhovujících VZ	sanitní vozidla	výstavba modernizace ICT	dostupnost a zajištění služeb
1	Elektronizace evidence pacientů při HPO (PKP1)	Cílem projektu je implementace elektronického systému pro jednotnou evidenci a přehled o osobách při hromadném postižení osob (HPO). Systém umožní promítnutí aktuálních změn zdravotního stavu a směřování pacientů do vhodných zdravotnických zařízení, odstraní možnost chyb a nejistotu v současné praxi.	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace	Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary	5 200 000	4 420 000	02/2022	2026	počet pořízeného vybavení	zvýšení	projektový záměr	nerelevantní	x			x	x
1	Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech	Cílem projektu je zajištění pokrytí území a snížení dojezdové doby k pacientům v odlehlých oblastech Chebska.	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace	Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary	25 001 300	21 251 105	09/2021	2026	počet nových objektů	zvýšení	zpracovaná PD, převod pozemku, sítě	ne	x	x			x
1	Vybudování společného operačního střediska - část ZOS (ZOS 1)	Cílem projektu je vybudování zdravotnického operačního střediska (ZOS), v rámci plánovaného společného operačního střediska (SOS), kde budou integrovány složky IZS Karlovarského kraje - HZS, PČR, ZZS i MP Karlovy Vary.	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace	Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary	0	0	01/2023	2026	počet pořízeného vybavení	zvýšení	projektový záměr	nerelevantní				x	
1	Vybudování výcvikového pracoviště operátorů (ZOS2)	Cílem projektu je vytvoření výcvikového pracoviště operátorů v rámci Společného operačního střediska (SOS).	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace	Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary	0	0	01/2023	2026	počet pořízeného vybavení	zvýšení	projektový záměr	nerelevantní				x	
1	Obnova výjezdových vozidel ZZS (TECH 2)	Cílem projektu je obnova vozového parku (výjezdová vozidla) pro zvýšení připravenosti k poskytování přednemocniční neodkladné péče v Karlovarském Kraji	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace	Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary	59 920 000	50 932 000	02/2022	2026	počet pořízeného vybavení	zvýšení	projektový záměr	nerelevantní	x		x		x
					90 121 300	76 603 105											
max. do výše 130 % stanovené alokace (99 584 122 Kč při kurzu 24,50 Kč / 1 Euro), (100% 76 603 171 Kč)																	



Milníky čerpání:

ZZS							
Rok	Objem alokace EFRR za rok ve výzvách	Roky kumulativně	Objem alokace EFRR kumulativně v letech ve výzvách	Rok	Objem alokace EFRR za rok v ŽoP	Roky kumulativně	Objem alokace EFRR kumulativně v letech v ŽoP
2021	0	2021	0	2021	0	2021	0
2022	318 825 713	2021-2022	318 825 713	2022	0	2021-2022	0
2023	324 052 364	2021-2023	642 878 078	2023	0	2021-2023	0
2024	329 279 015	2021-2024	972 157 093	2024	0	2021-2024	0
2025	334 505 666	2021-2025	1 306 662 760	2025	318 825 713	2021-2025	318 825 713
2026	277 199 171	2021-2026	1 583 861 931	2026	324 052 364	2021-2026	642 878 078
2027	282 799 154	2021-2027	1 866 661 085	2027	329 279 015	2021-2027	972 157 093
2028	0	2021-2028		2028	334 505 666	2021-2028	1 306 662 760
2029	0	2021-2029		2029	559 998 326	2021-2029	1 866 661 085

5. Deinstitutionalizace sociálních služeb

Klíč: Dle tabulky projektů projednané po dohodě s MPSV, MMR-IROP a AKČR.

Alokace pro Karlovarský kraj = 56 100 000 Kč

Závazek RAP: ŘO IROP nestanoví povinné indikátory, ani cílovou hodnotu na kraj.

Indikátory nebyly naplněny, neboť projektový záměr nebyl podán do příslušné výzvy IROP.

Schválený projektový záměr, viz. příloha č.4, nebyl ke dni 30.06.2024 podán do 58. výzvy IROP. *Procento čerpání (schválené ŽoP) v této aktivitě RAP za Karlovarský kraj činí 0 %.*



Příloha č.4: Aktuální seznam projektových záměrů, deinstitutionalizace sociálních služeb ke dni 13.11.2023

Deinstitutionalizace sociálních služeb												
Seznam projektů	Název projektu	Stručný obsah projektu	Žadatel	Adresa žadatele, kontaktní údaje žadatele	Výdaje projektu v Kč		Předpokládaný termín realizace měsíc, rok		Naplnění indikátorů		Stav připravenosti projektu k realizaci	
					celkové výdaje projektu	z toho podíl EFRR	zahájení realizace	ukončení realizace	název indikátoru	cílová hodnota dosažená realizací		
1	Výstavba domu pro osoby s poruchou autistického spektra	Cílem projektu je zlepšení a zkvalitnění sociálních služeb pro specifické cílové skupiny v rámci zajištění péče o osoby blízké. V rámci zařízení bude uživatelům sociální služby zajištěna péče na území Karlovarského kraje a jejich rodinní příslušníci se nebudou stěhovat do jiného kraje, kde jsou obdobná specializovaná zařízení sociálních služeb k dispozici. Vznik nových sociálních služeb pro obyvatele Karlovarského kraje pro cílovou skupinu - osoby s poruchou autistického spektra v souladu se SPRSS KK. Hlavním cílem projektu je výstavba nového objektu pro poskytování sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením pro osoby s poruchou autistického spektra, ve formě jednoho až dvou bezbariérového domku rodinného charakteru, případně dvojdomku , včetně vytvoření zázemí pro pracovníky sociální služby, s cílem zajistit bezpečné prostředí pro uživatele a zaměstnance ve službě komunitního typu.	Karlovarský kraj	Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary	85 800 000	72 930 000	01.01.2022	31.12.2025	Kapacita nově vystavených objektů sociální služby DOZP	termín dokončení 31. 12. 2026 zatím není stanoveno	Hlavním cílem projektu je výstavba nového objektu pro poskytování sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením pro osoby s poruchou autistického spektra, ve formě jednoho až dvou bezbariérového domku rodinného charakteru, případně dvojdomku , včetně vytvoření zázemí pro pracovníky sociální služby, s cílem zajistit bezpečné prostředí pro uživatele a zaměstnance ve službě komunitního typu. -Záměr vyplývá ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021-2023 a bude navazovat na plánovanou transformaci Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvkové organizace.: V současné době se připravuje transformační plán. Projekt je ve fázi projektové přípravy.	NE
max. do výše 130 % stanovené alokace (tj. 72 930 000 Kč)					100% alokace =	66 000 000	56 100 000					



Opatření k eliminaci rizika nevyčerpání alokace:

Probíhá plnění ze smlouvy o dílo na zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně vydání stavebního povolení s termínem dokončení 09/2024. Souběžně probíhá schvalování na MPSV transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o. Zahájení výstavby je plánováno v 04/2025 a ukončení výstavby včetně vybavení domu je předpokládáno do 12/2026. Předpokládá se podání žádosti do příslušné výzvy do konce roku 2024. Probíhá intenzivní komunikace mezi sekretariátem Regionální stálé konference karlovarského kraje, Odborem řízení projektů (jenž má podání a administraci žádosti ve své kompetenci) a Odborem sociálním Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Milníky čerpání:

DI							
Rok	Objem alokace EFRR za rok <u>ve výzvách</u>	Roky kumulativně	Objem alokace EFRR kumulativně v letech <u>ve výzvách</u>	Rok	Objem alokace EFRR za rok v <u>ŽoP</u>	Roky kumulativně	Objem alokace EFRR kumulativně v letech v <u>ŽoP</u>
2021	0	2021	0	2021	0	2021	0
2022	0	2021-2022	0	2022	0	2021-2022	0
2023	1 224 662 075	2021-2023	1 224 662 075	2023	0	2021-2023	0
2024	627 265 941	2021-2024	1 851 928 016	2024	0	2021-2024	0
2025	637 222 543	2021-2025	2 489 150 559	2025	0	2021-2025	0
2026	528 055 511	2021-2026	3 017 206 070	2026	1 224 662 075	2021-2026	1 224 662 075
2027	538 723 300	2021-2027	3 555 929 370	2027	627 265 941	2021-2027	1 851 928 016
2028	0	2021-2028		2028	637 222 543	2021-2028	2 489 150 559
2029	0	2021-2029		2029	1 066 778 811	2021-2029	3 555 929 370

Na základě Metodického stanoviska ministra pro místní rozvoj č. 2 k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027, verze 1.1, (Toto metodické stanovisko vstoupilo v platnost a účinnost dnem podpisu příslušného dopisu ministra pro místní rozvoj, tj. 18. ledna 2024) byla doplněna aktivita RAP:

6. Poradny a speciální školy (školská poradenská zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a střediska výchovné péče)

Klíč: Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami celkem v MŠ, ZŠ a SŠ.

Alokace pro Karlovarský kraj = 28 066 330,79 Kč

Závazek RAP: ŘO IROP nestanoví povinné indikátory, ani cílovou hodnotu na kraj.

Indikátory nebyly naplněny, neboť projektový záměr nebyl podán do příslušné výzvy IROP.

Schválené projektové záměry, viz. příloha č.5, nebyl ke dni 30.06.2024 podán do 95. výzvy IROP. *Procento čerpání (schválené ŽoP) v této aktivitě RAP za Karlovarský kraj činí 0%.*



Příloha č.5: Aktuální seznam projektových záměrů, poradny a speciální školy ke dni 22.03.2024

Seznam projektů	Žadatel	Identifikace organizace (školy či školského zařízení)					Název projektu	Obec realizace	Stručný popis investic projektu	Výdaje projektu v Kč		Předpokládaný termín realizace měsíc, rok		Naplnění indikátorů		Stav připravenosti projektu k realizaci			
		Název organizace	Zřizovatel (název, IČ)	IČ školy či školského zařízení	IZO	REDIZO				celkové výdaje projektu	z toho podíl EFRR 1)	zahájení realizace	ukončení realizace	název indikátoru	cílová hodnota dosažená realizací projektu	stručný popis, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele	vydané stavební povolení ano/ne		
1	Základní škola Ostrov, příspěvková organizace	Základní škola Ostrov, příspěvková organizace	Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary IČ 70891168	70839000	108018423	600022846	Nové odborné učebny a zázemí pro pedagogy	Ostrov	V rámci projektu bude realizována investice do učebny pro výuku nové informatiky dle revize RVP CZ, rozvoj digitální gramotnosti i přesah k rozvoji kompetencí potřebných pro uplatnění ve 21. století. V rámci projektu bude realizována investice do mobilní učebny využitelné pro rozvoj digitální gramotnosti, pro práci se žáky dle jejich specifických vzdělávacích potřeb a v rámci logopedie. Investice do zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání.	6 392 123,00	5 433 304,55	6/2024	9/2024	Indikátor výstupu: Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízeních 33	záměr	není potřeba			
2	Město Toužim	Základní škola a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace	Město Toužim, 00255076	60611448	102516839	600067700	Přístavba herny ke třídě školní družiny, formou zimní zahrady	Toužim	Přístavba herny ke třídě školní družiny, formou zimní zahrady, propojené se třídou. Úprava venkovního povrchu vhodná pro pohyb dětí.	0	0	1.9.2023	31.12.2024		zpracovaná PD	ano			
3	Základní škola Vítězství	Základní škola Vítězství Mariánské Lázně, příspěvková organizace	Město Mariánské Lázně, IČ 00254061	477 24 978	600 066 606	600 066 606	Vnitřní konektivita školy - modernizace učebny IT vč. zasíťování školy	Mariánské Lázně	vnitřní konektivita školy - modernizace učebny IT vč. zasíťování školy	0	0	2023	2024	500000	1	prováděcí dokumentace	nerelevantní		
4	Základní škola Vítězství	Základní škola Vítězství Mariánské Lázně, příspěvková organizace	Město Mariánské Lázně, IČ 00254061	477 24 978	600 066 606	600 066 606	Zateplení podkroví školy - rekonstrukce střechy	Mariánské Lázně	Zateplení podkroví školy - rekonstrukce střechy	13 000 000	11 050 000	2023	2024	500000	1	prováděcí dokumentace	nerelevantní		
5	Základní škola Vítězství	Základní škola Vítězství Mariánské Lázně, příspěvková organizace	Město Mariánské Lázně, IČ 00254061	477 24 978	600 066 606	600 066 606	Zateplení podkroví školy - rekonstrukce střechy	Mariánské Lázně	Zateplení podkroví školy - rekonstrukce střechy	21 000 000	17 850 000	2024	2025	500000	1	prováděcí dokumentace	nerelevantní		
										34 333 305									
max. do výše 130 % stanovené alokace (36 486 229 Kč = 130%), (100% = 28 066 330Kč)																			



Opatření k eliminaci rizika nevyčerpání alokace:

Probíhají intenzivní přípravy projektového záměru Základní škola Ostrov, příspěvková organizace. Probíhá kontinuální komunikace o postupu přípravných prací mezi Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu karlovarského kraje, nositelem projektu a sekretariátem Regionální stálé konference Karlovarského kraje. Předpokládá se podání žádosti do příslušné výzvy do konce roku 2024.

Milníky čerpání:

Speciální školy							
Rok	Objem alokace EFRR za rok ve výzvách	Roky kumulativně	Objem alokace EFRR kumulativně v letech ve výzvách	Rok	Objem alokace EFRR za rok v ŽoP	Roky kumulativně	Objem alokace EFRR kumulativně v letech v ŽoP
2021	0	2021	0	2021	0	2021	0
2022	0	2021-2022	0	2022	0	2021-2022	0
2023	242 297 216	2021-2023	242 297 216	2023	0	2021-2023	0
2024	124 103 452	2021-2024	366 400 669	2024	0	2021-2024	0
2025	126 073 348	2021-2025	492 474 017	2025	0	2021-2025	0
2026	104 474 845	2021-2026	596 948 862	2026	242 297 216	2021-2026	242 297 216
2027	106 585 448	2021-2027	703 534 310	2027	124 103 452	2021-2027	366 400 669
2028	0	2021-2028		2028	126 073 348	2021-2028	492 474 017
2029	0	2021-2029		2029	211 060 293	2021-2029	703 534 310

7. Milníky RAP obecně

ŘO IROP doporučuje, aby uvedená alokace roku 2022 byla obsažena v předložených žádostech o podporu (po odečtení projektů v negativních stavech) do 12 měsíců od vyhlášení výzvy. Toto doporučení platí analogicky i pro každou další roční alokaci. Alokace roku 2022 musí být do 30 měsíců od posledního dne roku 2022 (tj. do 30. 6. 2025) v předložených žádostech o platbu či vyšších pozitivních stavech ŽoP60. Z tohoto pravidla jsou vyjmuty aktivity pod čísly 5) Deinstitutionalizace sociálních služeb – investiční část a 6) Poradny a speciální školy (školská poradenská zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a střediska výchovné péče), u kterých se bude limit počítat kumulativně od posledního dne roku, kdy dojde k vyhlášení výzvy

V dalších letech je postupováno podle stejné logiky. Limity jsou vyhodnocovány za každé téma RAP zvlášť. ŘO IROP vyhodnotí ve 3. čtvrtletí příslušného roku (počínaje rokem 2025) plnění limitů n+3. Plnění bude ŘO IROP posuzovat za všechny kraje v součtu dohromady. Pokud bude vyhodnocením dat zjištěno, že nedošlo k naplnění limitů pro splnění limitů n+3, bude nenaplněnou část alokace odečítat těm krajům, které nenaplnění způsobily.“ a to včetně poznámky pod čarou v následujícím znění: „Do zkoumaného objemu se nezapočítají ŽoP, které sice byly předloženy, ale nebyly schválené. Dále také nejsou zahrnovány případné ŽoP na projektech v negativním stavu. V případě, že ŽoP byla schválena, ale došlo k jejímu krácení, je použita výsledná schválená částka, nikoliv předložená částka.“



Milníky čerpání celkem za RAP:

	Podíl objemu alokace EFRR za rok <u>ve výzvách</u>	Roky kumulativně	Podíl objemu alokace EFRR kumulativně v letech <u>ve výzvách</u>	Rok	Podíl objemu alokace EFRR za rok v <u>ŽoP</u>	Roky kumulativně	Podíl objemu alokace EFRR kumulativně v letech v <u>ŽoP</u>
2021	0,00%	2021	0,00%	2021	0,00%	2021	0,00%
2022	17,08%	2021-2022	17,08%	2022	0,00%	2021-2022	0,00%
2023	17,36%	2021-2023	34,44%	2023	0,00%	2021-2023	0,00%
2024	17,64%	2021-2024	52,08%	2024	0,00%	2021-2024	0,00%
2025	17,92%	2021-2025	70,00%	2025	17,08%	2021-2025	17,08%
2026	14,85%	2021-2026	84,85%	2026	17,36%	2021-2026	34,44%
2027	15,15%	2021-2027	100,00%	2027	17,64%	2021-2027	52,08%
2028	0,00%	2021-2028	0,00%	2028	17,92%	2021-2028	70,00%
2029	0,00%	2021-2029	0,00%	2029	30,00%	2021-2029	100,00%

Rok	Objem alokace EFRR za rok <u>ve výzvách</u>	Roky kumulativně	Objem alokace EFRR kumulativně v letech <u>ve výzvách</u>	Rok	Objem alokace EFRR za rok v <u>ŽoP</u>	Roky kumulativně	Objem alokace EFRR kumulativně v letech v <u>ŽoP</u>
2021	0	2021	0	2021	0	2021	0
2022	3 311 532 810	2021-2022	3 311 532 810	2022	0	2021-2022	0
2023	3 365 820 233	2021-2023	6 677 353 044	2023	0	2021-2023	0
2024	3 420 107 657	2021-2024	10 097 460 700	2024	0	2021-2024	0
2025	3 474 395 080	2021-2025	13 571 855 780	2025	3 311 532 810	2021-2025	3 311 532 810
2026	2 879 172 262	2021-2026	16 451 028 042	2026	3 365 820 233	2021-2026	6 677 353 044
2027	2 937 337 358	2021-2027	19 388 365 400	2027	3 420 107 657	2021-2027	10 097 460 700
2028	0	2021-2028		2028	3 474 395 080	2021-2028	13 571 855 780
2029	0	2021-2029		2029	5 816 509 620	2021-2029	19 388 365 400

8. Závěr

U tří aktivit RAP (deinstitutionalizace sociálních služeb; střední školství a speciální školy) nedošlo ke dni 30.06.2024 k podání žádostí do příslušných výzev IROP. Z tohoto vyplývá, že procento čerpání (schválené ŽoP) činí v těchto oblastech 0%. Předpokladem je podání připravovaných žádostí do konce roku 2024.

U aktivity RAP Zdravotnické záchranné služby došlo k podání 2 projektových záměrů (PZ) ze 3 schválených. U těchto PZ ovšem ještě nedošlo k předložení ŽoP – procento čerpání i zde činí 0%.

V případě aktivity RAP Silnice II. třídy činila výše čerpání k datu 30.6.2024 *ve schválených a proplacených ŽoP 2,86%* (bráno ku 100% alokaci stanovené pro KVK).
